





PHASE	Travaux Place		Durée Prév. : 120 jours
	AEP		
TRAUVAX	EU	Pose de la conduite PVC 200	1 jour
	EP	Pose des conduites PVC 500 et décanteurs	14 jours
	Brchts		



PHASE	Travaux Grande Rue – Secteur 1-1		Durée Prév. : 120 jours
	AEP		
TRAUVAX	EU	Pose de la conduite FTE (tranchée commune)	
	EP	Pose de la conduite PVC 200 (tranchée commune)	8 jours
	Brchts	Dépose de la conduite existante & Pose de la conduite BA 800	
		Reprise des branchements	15 jours




PHASE	Travaux Grande Rue – Secteur 1-2		Durée Prév. : 120 jours
	AEP		
TRAUVAX	EU	Pose de la conduite FTE (tranchée commune)	
	EP	Pose de la conduite PVC 200 (tranchée commune)	4 jours
	Brchts	Dépose de la conduite existante & Pose de la conduite PVC 500	
		Reprise des branchements	15 jours

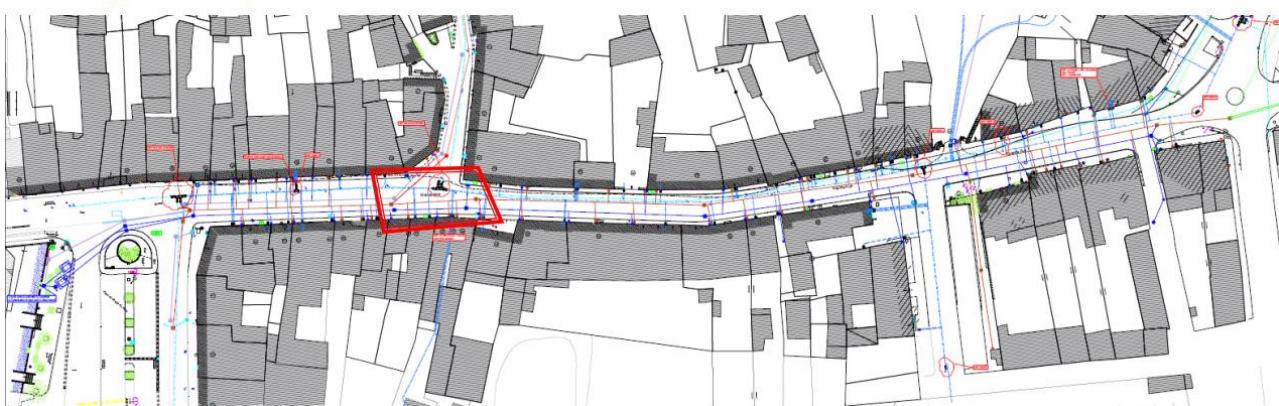



PHASE	Travaux Grande Rue – Secteur 2-1			Durée Prév. : 120 jours
TRAVAUX	AEP	Pose de la conduite FTE (tranchée commune AEP / EU) et réalisation d'une sauterelle		21 jours
EU	Pose de la conduite PVC 200 (tranchée commune AEP / EU)			21 jours
EP	Dépose de la conduite existante & Pose de la conduite PVC 500			21 jours
Cyprès	AEP & EU			4 jours
Brchts	Reprise des branchements secteur 2			48 jours

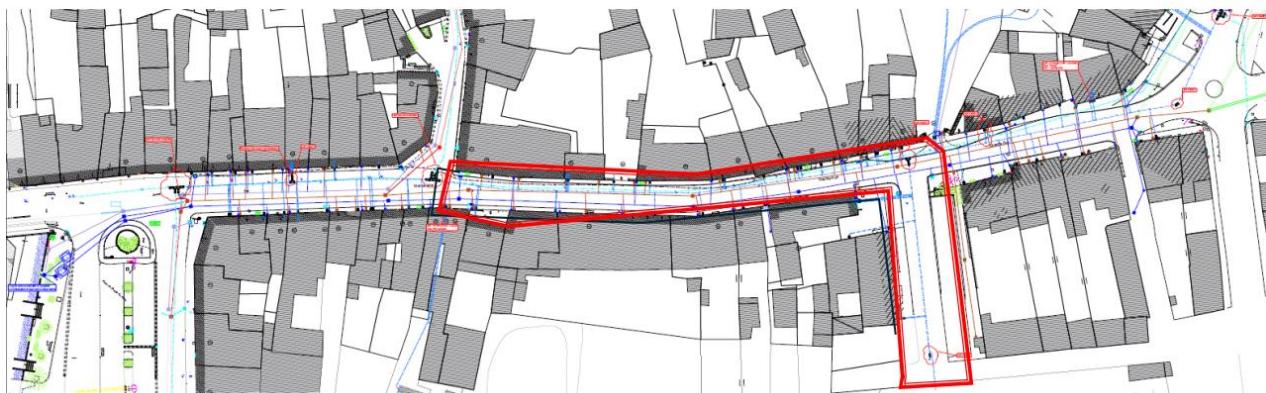

PHASE	Travaux Grande Rue – Secteur 2-2			Durée Prév. : 120 jours
TRAVAUX	AEP	Pose de la conduite FTE (tranchée commune AEP / EU)		14 jours
EU	Pose de la conduite PVC 200 (tranchée commune AEP / EU)			14 jours
EP	Dépose de la conduite existante & Pose de la conduite PVC 500			14 jours
Brchts	Reprise des branchements secteur 2			48 jours

