

Piste cyclable Rochefort - Savennières

Information des travaux de voirie :
2^{ème} phase

Réunion publique du 6 juillet 2026

Déroulé de la réunion

Mot d'accueil et présentation des intervenants

- Rappel des travaux en cours
- Retour sur la préparation de la 2^{ème} phase
- Modalités de travaux de la 2^{ème} phase et calendrier

Temps d'échanges

Mot de Conclusion

Contexte et objectif de la liaison cyclable

- Mettre en œuvre une liaison cyclable à haut niveau de service, inscrite au schéma cyclable de Loire Layon Aubance;
- Créer une infrastructure sécurisée pour les accès vélo à la gare ferroviaire de Savennières ;
- Donner une alternative aux déplacements en voiture individuelle.

Rappel des travaux déjà menés



▶ Travaux en cours

Travaux du 27 avril 2026 au 31 juillet 2026

- **Circulation alternée**
du 27 avril 2026 au 30 juillet 2026
- **Trauvax en route barrée en journée**
du 27 au 29 mai 2026
- **Interruption canicule**
du 22 juin au 26 juin 2026
- **Arrets des travaux et réouverture provisoire**
du 31 juillet 2026 au 24 aout 2026

(1) Tronçon non réalisé



(2) Tronçons réalisés



(3) Tronçon en cours de travaux



Travaux réalisés : pont de la Guillemette - trémie



Coulage des bordures



Retour sur la préparation de la 2^{ème} phase



► Réunions de concertation

Rencontres organisées en juin 2026

En complément des échanges avec les élus des différentes communes, concertation avec les usagers utilisant plusieurs fois par jour la route départementale pour des besoins professionnels, hors trajets domicile-travail :

- Agriculteurs, viticulteurs ;
- Personnel de santé ;
- Commerçants, hébergeurs, restaurateurs ;
- Services publics : déchet, transports régulier et scolaire, La Poste.

Synthèse des retours

- Jours de route barrée en journée reportés à la fin des vendanges ;
- Communication renforcée ;
- Aménagements des horaires et des points de desserte de transports pour les services publics ;
- Usage du chemin derrière l'hippodrome réservé aux tracteurs et aux professionnels de santé.

Modalités de travaux de la 2ème phase et calendrier

Les périodes de fermeture des tronçons (1) et (3) ne sont pas prévues en simultané. **L'accès à Béhuard est conservé pendant la durée des travaux.**


Tronçon (1)



(2) Tronçons réalisés




Tronçon (3)

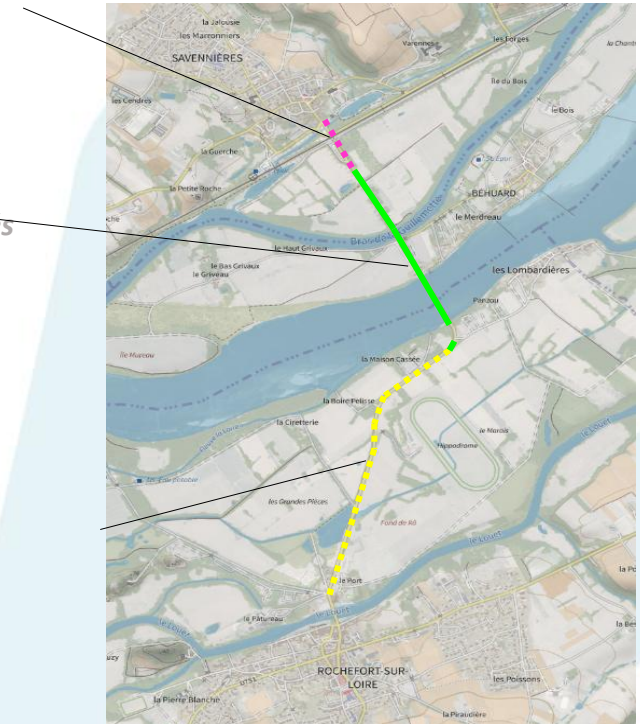

Aménagement Phase 2 – Tronçon 3

Sortie de Rochefort – Pont des Lombardières

- Réalisation pistes cyclables latérales avec bordure de séparation

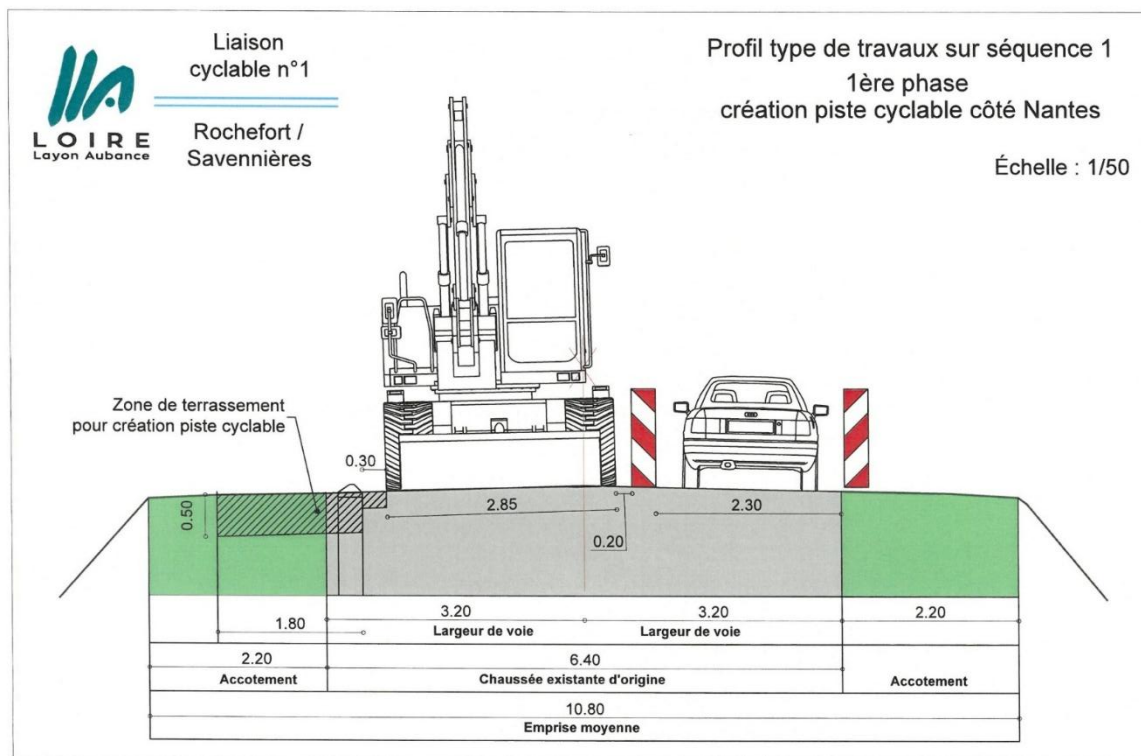


Aménagement Phase 2 – Tronçon 3


Sortie de Rochefort – Pont des Lombardières

Mai 2026		Juin 2026		Juillet 2026		Août 2026		Septembre 2026		Octobre 2026	
1 V		1 L		1 M		1 S		1 M		1 J	
2 S		2 M		2 J		2 D		2 M		2 V	
3 D		3 M		3 V		3 L	CONGES	3 J		3 S	
4 L		4 J		4 S		4 M		4 V		4 D	
5 M		5 V		5 D		5 M		5 S		5 L	
6 M		6 S		6 L		6 J		6 D		6 M	
7 J		7 D		7 M		7 V		7 L		7 M	
8 V		8 L		8 M		8 S		8 M		8 J	
9 S		9 M		9 J		9 D		9 M		9 V	
10 D		10 M		10 V		10 L	CONGES	10 J		10 S	
11 L		11 J		11 S		11 M		11 V		11 D	
12 M		12 V		12 D		12 M		12 S		12 L	
13 M		13 S		13 L		13 J		13 D		13 M	
14 J		14 D		14 M		14 V		14 L		14 M	
15 V		15 L		15 M		15 S		15 M		15 J	
16 S		16 M		16 J		16 D		16 M		16 V	
17 D		17 M		17 V		17 L	CONGES	17 J		17 S	
18 L		18 J		18 S		18 M		18 V		18 D	
19 M		19 V		19 D		19 M		19 S		19 L	
20 M		20 S		20 L		20 J		20 D		20 M	
21 J		21 D		21 M		21 V		21 L		21 M	
22 V		22 L		22 M		22 S		22 M		22 J	
23 S		23 M		23 J		23 D		23 M	COULAGE BORDURES	23 V	
24 D		24 M	Canicule	24 V		24 L	CONGES	24 J		24 S	
25 L		25 J		25 S		25 M		25 V		25 D	
26 M		26 V		26 D		26 M		26 S		26 L	
27 M		27 S		27 L		27 J		27 D		27 M	
28 J		28 D		28 M		28 V		28 L		28 M	
								29 M	COULAGE BORDURES	29 J	
								30 M		30 V	
										31 S	

La période de coulage est prévue dès la fin des vendanges


Circulation alternée avec feux de chantier de 7H30 à 17H30




Route Barrée de 8H15 à 16H45


Travaux sans restriction de circulation

Aménagement Phase 2 – Tronçon 1


Trémie Savennières

- Réalisation pistes cyclables latérales sur trottoir avec cheminement piéton

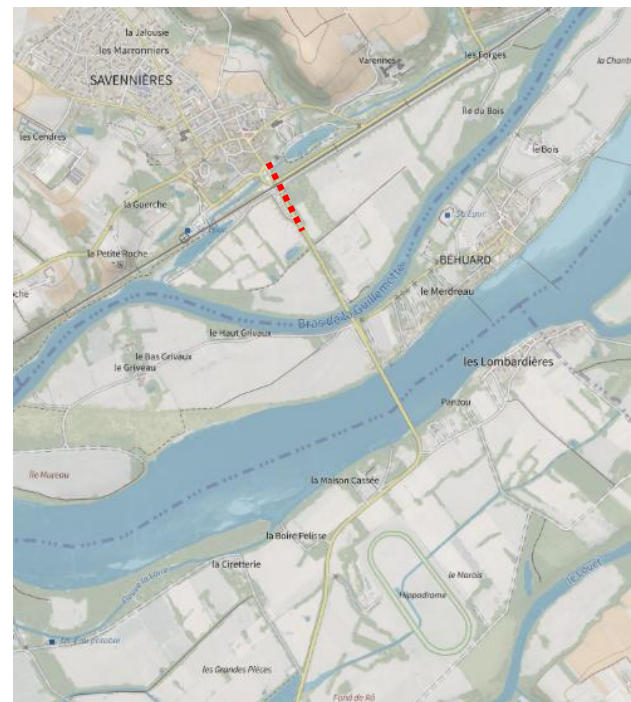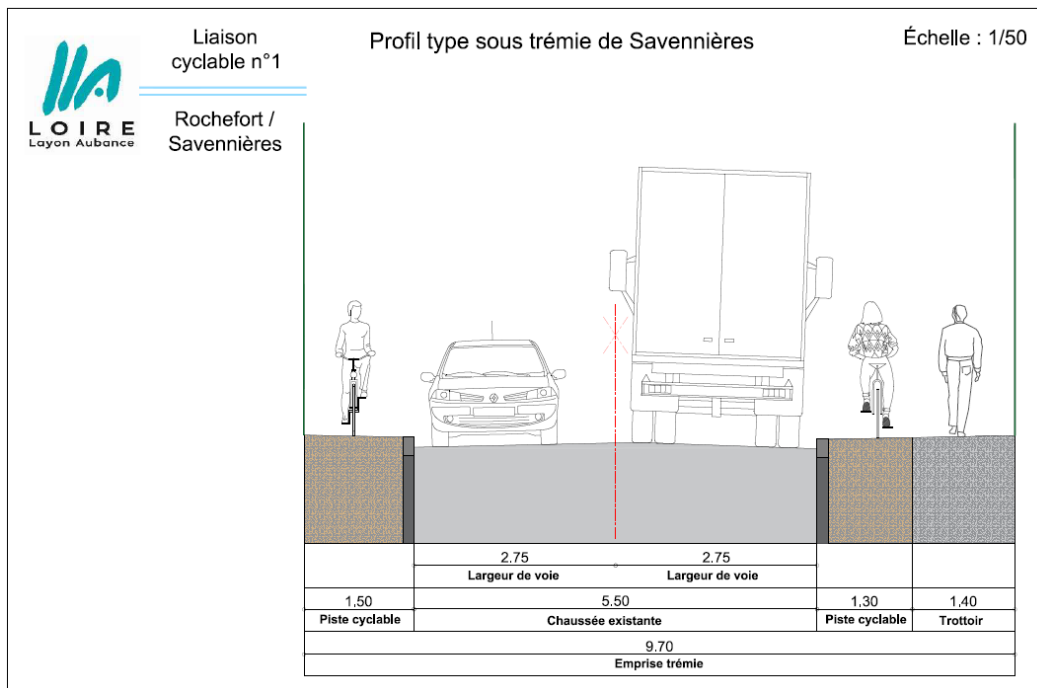

Contraintes sous la trémie

PROFIL TYPE DES TRAVAUX sous la trémie SNCF à SAVENNIERES

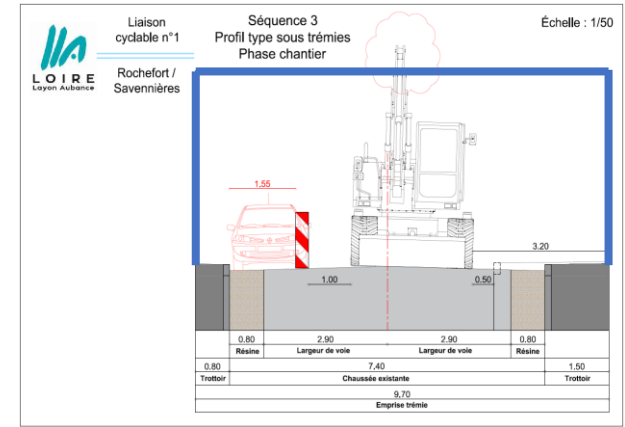

Aménagement Phase 2 – Tronçon 1

Trémie Savennières

Vacances
Scolaires de
la
TOUSSAINTS


Route Barrée
de 8H15 à
16H45

*La date de démarrage sera ajustée en fonction de la fin des travaux
du tronçon 3*

Octobre 2026			Novembre 2026		
1	J		1	D	
2	V		2	L	SEMAINE 4
3	S		3	M	
4	D		4	M	
5	L		5	J	
6	M		6	V	
7	M		7	S	
8	J		8	D	
9	V		9	L	
10	S		10	M	
11	D		11	M	
12	L	SEMAINE 1	12	J	
13	M		13	V	
14	M		14	S	
15	J	SEMAINE 2	15	D	
16	V		16	L	
17	S		17	M	
18	D		18	M	
19	L		19	J	
20	M	SEMAINE 3	20	V	
21	M		21	S	
22	J		22	D	
23	V		23	L	
24	S		24	M	
25	D		25	M	
26	L		26	J	
27	M		27	V	
28	M		28	S	
29	J		29	D	
30	V		30	L	
31	S				

Temps d'échanges

Mot de Conclusion

Merci de votre présence
