

ARRETE TEMPORAIRE

**portant réglementation de la circulation sur :
la route départementale 44
la commune de RUFFIGNE**

Référence : CJ RD44
N° : T-C-2026-03-075

**LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIRE-ATLANTIQUE
LE MAIRE DE LA COMMUNE DE RUFFIGNE**

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L3221-4, L2213-1 et suivants ;

VU le code de la route, notamment ses articles L110-1 et suivants, R411-1 et suivants, R413-1 et suivants ;

VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;

VU le code de la voirie routière et notamment les articles L113-1 et R113-1 ;

VU l'instruction interministérielle en vigueur sur la signalisation routière et notamment la 8ème partie, signalisation temporaire ;

VU le règlement de voirie en vigueur du Département de Loire-Atlantique ;

VU l'avis favorable du Maire de SAINT-AUBIN-DES-CHATEAUX ;

VU l'avis favorable du Maire de SION-LES-MINES ;

CONSIDERANT qu'il convient de réglementer temporairement la circulation sur la route départementale 44 afin de réaliser des travaux d'aménagement de voirie.

ARRÊTENT

ARTICLE 1

La circulation routière sera interdite sur la route départementale 44 classée RDL2 entre les PR 11 + 815 et 12 + 220' sur le territoire de la commune de RUFFIGNE.

du mardi 17 mars 2026 au vendredi 03 avril 2026

La restriction s'appliquera sur la section courante sur l'ensemble de la chaussée.

Toutefois, l'accès sera autorisé pour les Riverains.

La restriction sera maintenue 24h/24.

En cas d'aléas techniques ou météorologiques, l'application de ces mesures de restriction pourra être prolongée jusqu'au vendredi 10 avril 2026.

ARTICLE 2

La circulation sera déviée dans les deux sens par :

- Route départementale RD40
- Route départementale RD34

* Coordonnées GPS : RD44 de 47.757210,-1.494607 à 47.757845,-1.499463

ARTICLE 3

La fourniture, la pose, la dépose et la maintenance de la signalisation correspondante seront assurées par HERVE TP, route d'Ancenis 44670 Juigné-des-Moutiers, selon les règles de pose et de maintenance définies par le service aménagement de la Délégation de Châteaubriant.

ARTICLE 4

Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 5

Le présent arrêté sera affiché en mairie de la commune de RUFFIGNE et placardé aux extrémités du chantier ou des sections réglementées.

ARTICLE 6

Le Directeur général des services du Département de Loire-Atlantique,
Le directeur général des services de la commune de RUFFIGNE,
Le Commandant du groupement de gendarmerie de COB Chateaubriant,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à RUFFIGNE

Le 10/03/2026

Le Maire

Anita BONNIER



Fait à NOZAY


Le

11 MARS 2026

Pour le Président du Conseil Départemental,
L'adjoint au chef de service aménagement


Philippe BELIZAIRE

Situation des travaux

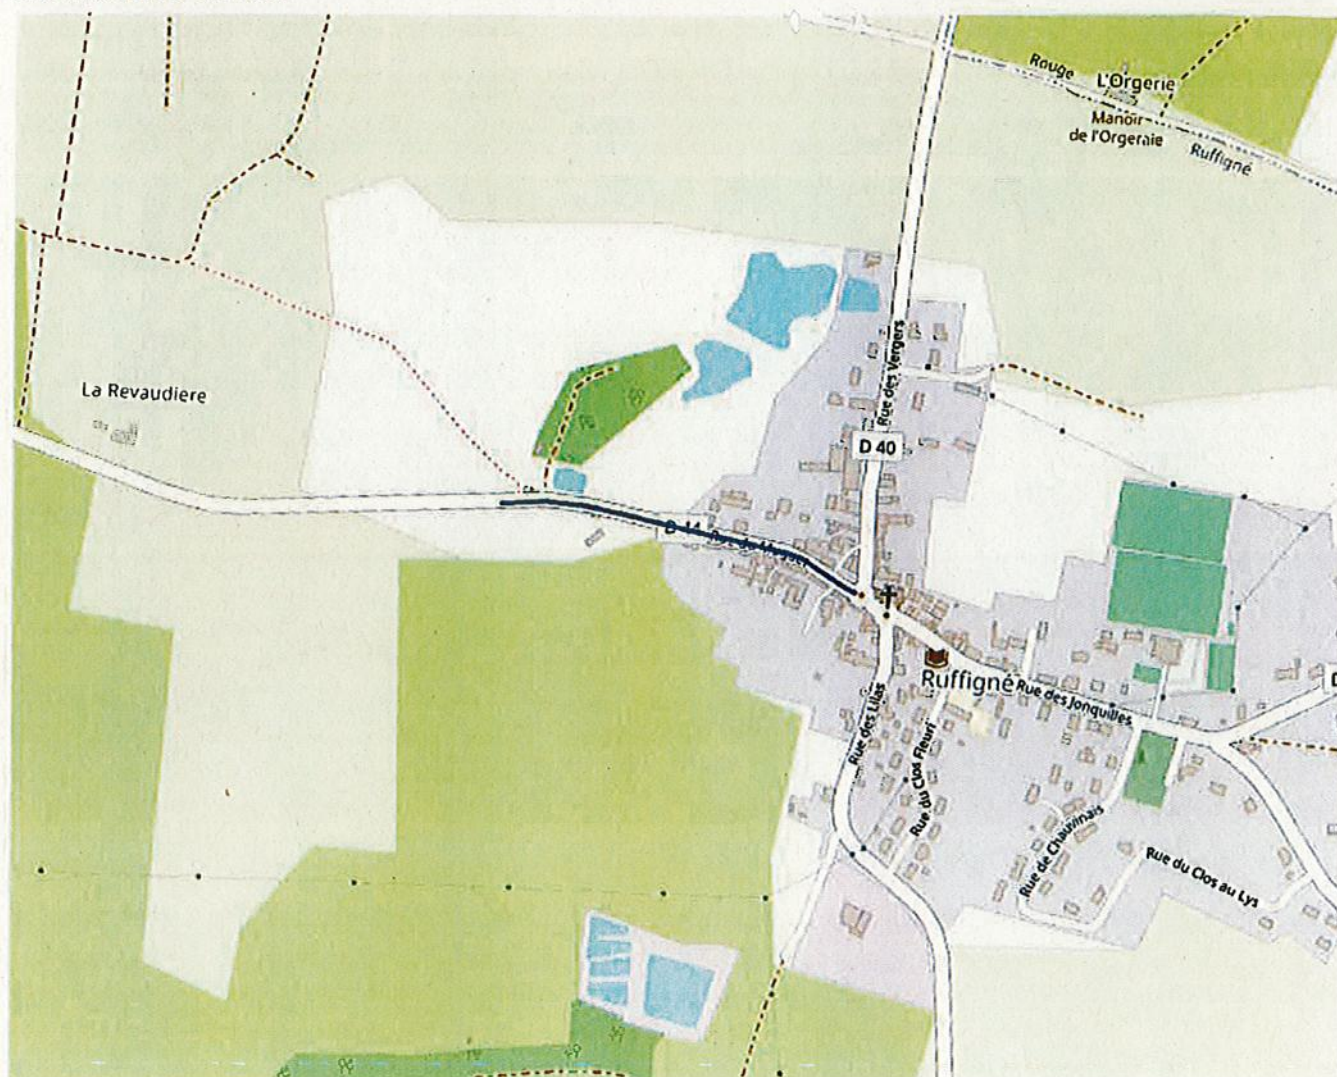

DéviatIon(s)

La circulation sera déviée par :



ACT 0474 /JC

CHATELAIN Joseph

De: Thomas PLOTEAU <t.ploteau@hervegroupe.fr>
Envoyé: mercredi 4 mars 2026 17:40
À: CHATELAIN Joseph; HOUSSAIS Stephane
Cc: Benoit LANE - HERVE GROUPE; 'Contact C2i'
Objet: Ruffigné - Rue du Muguet et des Vergers
Pièces jointes: Planning de S7 à S14 (25021 Ruffigné - Rues).pdf

VIGILANCE: Ce message provient d'une personne externe au Département. Un doute sur son contenu ? Faites suivre à securite.numerique@loire-atlantique.fr

Bonjour messieurs,

Déviaton RD 44 rue du muguet.

Comme j'ai déjà pu aborder avec vous, les finitions de voirie sur les deux rues de Ruffigné arrivent, et il va falloir que j'alterne les fermetures de rue pour l'avancée des travaux (planning actualisé en pièce-jointe).

Joseph, peux-tu actualiser les routes barrées pour les deux rues jusqu'au 08/04 inclus stp.
Stephane, pourrais-tu remettre en place la signalisation de déviation pour la Rue des Vergers stp.

Ainsi mes compagnons sur place pourraient gérer les panneaux de déviation au fur et à mesure des alternats.

Merci par avance,
Cordialement,




Thomas Ploteau
Aide conducteur de travaux

02.40.55.50.01 / 06.89.34.14.44
t.ploteau@hervegroupe.fr
www.hervegroupe.fr

Groupe Hervé - À vos côtés pour construire.
Travaux Publics | Béton prêt à l'emploi | Granulats | Recyclage & Valorisation | Matériaux de décoration



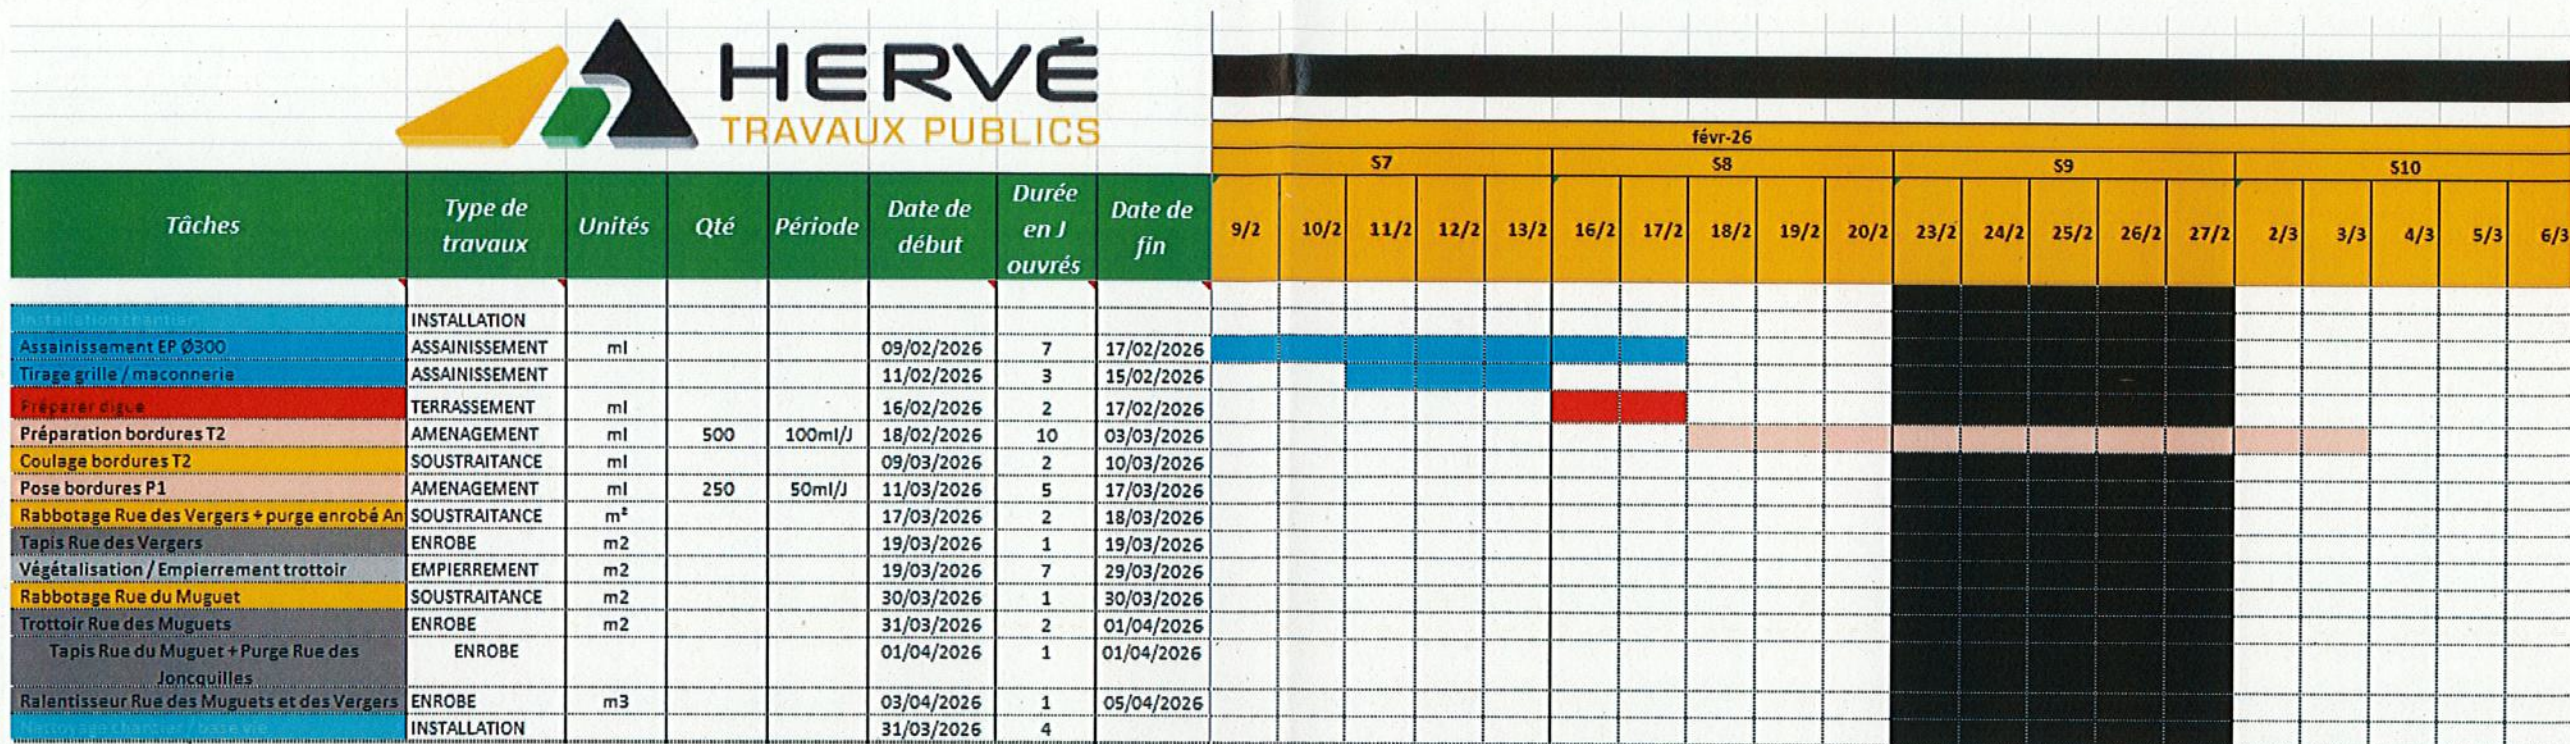



HERVÉ

TRAVAUX PUBLICS

PROJET DE TRAVAUX

								mars-26																														
								S10			S11					S12					S13					S14												
								4/3	5/3	6/3	9/3	10/3	11/3	12/3	13/3	16/3	17/3	18/3	19/3	20/3	23/3	24/3	25/3	26/3	27/3	30/3	31/3	1/4	2/4	3/4								
Tâches	Type de travaux	Unités	Qté	Période	Date de début	Durée en J ouvrés	Date de fin																															
	INSTALLATION							Route barrée Rue du Muguet																				Route barrée Rue des vergers				Route barrée Rue du Muguet						
Assainissement EP Ø300	ASSAINISSEMENT	ml			09/02/2026	7	17/02/2026																															
Tirage grille / maçonnerie	ASSAINISSEMENT				11/02/2026	3	15/02/2026																															
Préparer d'axe	TERRASSEMENT	ml			16/02/2026	2	17/02/2026																															
Préparation bordures T2	AMENAGEMENT	ml	500	100ml/j	18/02/2026	10	03/03/2026																															
Coulage bordures T2	SOUSTRAITANCE	ml			09/03/2026	2	10/03/2026																															
Pose bordures P1	AMENAGEMENT	ml	250	50ml/j	11/03/2026	5	17/03/2026																															
Rabotage Rue des Vergers + purge enrobé An	SOUSTRAITANCE	m²			17/03/2026	2	18/03/2026																															
Tapis Rue des Vergers	ENROBE	m2			19/03/2026	1	19/03/2026																															
Végétalisation / Empierrement trottoir	EMPIERREMENT	m2			19/03/2026	7	29/03/2026																															
Rabotage Rue du Muguet	SOUSTRAITANCE	m2			30/03/2026	1	30/03/2026																															
Trottoir Rue des Muguets	ENROBE	m2			31/03/2026	2	01/04/2026																															
Tapis Rue du Muguet + Purge Rue des Joncquilles	ENROBE				01/04/2026	1	01/04/2026																															
Ralentisseur Rue des Muguets et des Vergers	ENROBE	m3			03/04/2026	1	05/04/2026																															
	INSTALLATION				31/03/2026	4																																
